



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

**Объекты,
ввод в эксплуатацию которых запланирован
на 2019 год**



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность	Оснащение оборудованием
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО					
г. Абакан Общеобразовательная школа на 1000 мест в 6 микрорайоне 1 жилого района	2018 год	525,884	478,554	47,330	449,539	409,080	40,459	449,536	85,48	0	95 %	86%
		в том числе неизрасходованные средства 2018 года, возвращенные в 2019 году:						Исполнение в 2019 году				
	76,347	69,476	6,871	76,347	69,476	6,871	32,350	42,37				
2019 год	215,570	196,169	19,401	212,937	193,773	19,164	167,641	77,77	1000 мест			
ИТОГО:		741,454	674,723	66,731	662,476	602,853	59,623	649,527	87,60	1000 мест		

Риски: отсутствуют

Пояснения: Завершение строительных работ – до 15.10.2019. Оснащение оборудованием, ввод новых мест – 15.11.2019.



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Детский сад на 300 мест с бассейном по адресу: г. Абакана, ул.Чехова, 151 в III жилом районе	2018 год	137,994	125,575	12,420	104,481	95,078	9,403	104,481	75,71	0 мест	93%
		в том числе неизрасходованные средства 2018 года, возвращенные в 2019 году:						Исполнение в 2019 году			
	33,513	30,497	3,016	33,513	30,497	3,016	1,198	3,57			
2019 год	87,912	80,000	7,912	53,479	48,666	4,813	30,870	35,11	300 мест		
ИТОГО:		225,906	205,575	20,332	157,960	143,744	14,216	136,549	60,44	300 мест	

Риски: отсутствуют

Пояснения: в настоящее время проводятся конкурсные процедуры на закупки оборудования
Завершение строительных работ – до 15.10.2019. Ввод новых мест – 15.11.2019.



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Детский сад на 300 мест с бассейном по адресу: г. Абакана, ул.Арбан, во II жилом районе	2018 год	91,355	83,133	8,222	90,555	82,405	8,150	90,555	99,12	0 мест	86%
		в том числе неизрасходованные средства 2018 года, возвращенные в 2019 году:						Исполнение в 2019 году			
	0,800	0,728	0,072	0,800	0,728	0,072	0,800	100,00			
2019 год	90,952	82,766	8,186	71,100	64,701	6,399	53,313	58,62	300 мест		
ИТОГО:		182,307	165,900	16,408	161,655	147,106	14,549	144,668	79,35	300 мест	

Риски: отсутствуют

Пояснения: в настоящее время проводятся конкурсные процедуры на закупки оборудования
Завершение строительных работ – до 15.10.2019. Ввод новых мест – 15.11.2019.



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Детский сад на 300 мест с бассейном по адресу: г. Абакана, ул. Литвинова	2018 год	65,948	60,013	5,935	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0 мест	63%
		в том числе неизрасходованные средства 2018 года, возвращенные в 2019 году:						Исполнение в 2019 году			
	65,948	60,013	5,935	65,948	60,013	5,935	20,124	30,51			
2019 год	158,096	143,867	14,229	172,820	143,867	28,953	71,246	45,07	300 мест		
ИТОГО:		224,044	203,880	20,164	172,820	143,867	28,953	91,370	40,78	300 мест	

Риски: неосвоение средств субсидии на 2019 год

Пояснения: Неосвоенные средства 2018 года возвращены по дополнительному соглашению в 2019 году. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на закупки оборудования. Завершение строительных работ – до 20.11.2019. Ввод новых мест – 20.12.2019.



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Алтайский район Детский сад на 60 мест в селе Белый Яр	2018 год	31,519	29,413	2,107	31,519	29,413	2,107	31,519	100,00	0 мест	96%
	2019 год	9,234	8,403	0,831	9,234	8,403	0,831	9,234	100,00	60 мест	
ИТОГО:		41,556	37,816	3,740	41,556	37,816	3,740	41,556	100,00	60 мест	

Риски: отсутствуют

Пояснения: Завершение строительных работ – до 01.10.2019. Ввод новых мест – 30.10.2019.



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Алтайский район Детский сад на 60 мест в селе Подсинее	2018 год	15,242	13,140	2,102	7,616	6,930	0,686	7,616	49,97	0 мест	64%
		в том числе неизрасходованные средства 2018 года, возвращенные в 2019 году:						Исполнение в 2019 году			
	6,824	6,210	0,614	6,824	6,210	0,614	5,594	81,97			
	2019 год	27,116	24,676	2,440	33,940	30,885	3,055	10,761	39,68	60 мест	
	ИТОГО:	41,556	37,816	3,740	41,5558	37,815	3,7408	23,971	57,68	60 мест	

Риски: отсутствуют

Пояснения: Завершение строительных работ – до 01.11.2019. Ввод новых мест – 01.12.2019.



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Аскизский район Детский сад на 120 мест в селе Аскиз	2018 год	46,052	41,907	4,145	46,053	41,908	4,145	46,053	100,00	0 мест	85%
	2019 год	48,624	32,664	15,96	48,294	32,664	15,63	35,894	74,32	120 мест	
ИТОГО:		94,676	74,571	20,105	94,3465	74,572	19,7745	81,947	86,86	120 мест	

Риски: отсутствуют

Пояснения: Муниципальному образованию из республиканского бюджета выделены дополнительные средства в объеме 12,4 млн. руб.

Завершение строительных работ – до 01.10.2019. Ввод новых мест – 30.10.2019.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

**Объекты,
ввод в эксплуатацию которых запланирован
на 2020 год**



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Усть-Абаканский район Общеобразовательная школа на 250 мест в д. Чапаево	2019 год	107,604	97,920	9,684	106,425	96,847	9,578	20,531	19,08	0 мест	6%
	2020 год	179,856	163,669	16,187	79,950	72,755	7,195	0,0	0,0	250 мест	
ИТОГО:		287,460	261,589	25,872	186,375	169,602	16,773	20,531	7,14	250 мест	

Риски: неосвоение средств субсидии на 2019 год

Пояснения: Планируется освоить 60 млн, приобретением оборудования – 27,073 млн. руб.



Информация по реализации регионального проекта

Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
г. Абакан Общеобразовательная школа на 1000 мест в 8 микрорайоне	2019 год	259,621	257,025	2,596	259,621	257,025	2,596	117,735	45,35	0 мест	7%
	2020 год	629,921	623,622	6,299	629,921	623,622	6,299	0,000	0,00	1000 мест	
ИТОГО:		889,542	880,647	8,895	767,629	759,953	7,676	117,735	13,23	1000 мест	

Риски: отсутствуют

Пояснения: Согласовано перераспределение средств субсидии с 2019 на 2020 год в размере 370,3 млн. руб.



Информация по реализации регионального проекта

Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Ширинский район Учительский дом на 20 мест в аал Трошкино	2019 год	27,723	27,000	0,7230	—	—	—	—	—	20 мест	100%
ИТОГО:		27,723	27	0,723	0	0	0	0	0,00	20 мест	

Риски: отсутствуют

Пояснения: В 2018 году введено 20 мест путём строительства школа – учительского дома в аале Трошкино построена и начала работу 01.09.2018.

Финансирование строительства объекта в размере 29,847 млн. рублей в полном объёме произведено из средств регионального бюджета (использование механизма возмещения затрат регионального бюджета).



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Ширинский район Общеобразовательная школа на 250 мест в с. Целинное	2019 год	149,449	147,955	1,495	147,919	146,440	1,479	34,872	23,33	0 мест	6%
	2020 год	149,703	148,206	1,497	70,334	69,631	0,703	0,000	0,00	250 мест	
ИТОГО:		299,153	296,161	2,992	218,253	216,071	2,182	34,872	11,66	250 мест	

Риски: отсутствуют

Пояснения: Планируется освоить 90 млн, приобретением оборудования – 24,577 млн. руб.



Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Аскизский район Детский сад на 60 мест в п. Аскиз	2019 год	24,041	23,800	0,240	24,041	23,801	0,240	0,000	0,00	0 мест	0%
	2020 год	26,046	25,785	0,261	34,286	25,785	8,501	0,000	0,00	60 мест	
ИТОГО:		50,087	49,586	0,501	58,327	49,586	8,741	0,000	0,00	60 мест	

Риски: неосвоение средств субсидии на 2019 год

Пояснения: позднее начало проведения строительно-монтажных работ



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Аскизский район Детский сад на 120 мест в с. Бельтирское	2019 год	50,088	49,587	0,501	50,594	49,587	1,007	20,582	41,09	0 мест	2%
	2020 год	50,088	49,587	0,501	50,594	49,587	1,007	0,000	0,00	120 мест	
ИТОГО:		100,177	99,175	1,002	101,188	99,175	2,013	20,582	20,55	120 мест	


Риски: X

Пояснения: X



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

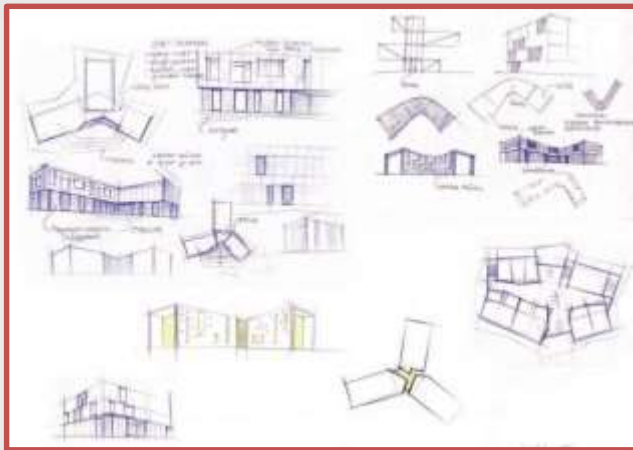

Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Бейский район Детский сад на 80 мест в с. Новокурс	2019 год	32,057	31,736	0,321	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0 мест	0%
	2020 год	34,728	34,381	0,347	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80 мест	
ИТОГО:		66,784	66,117	0,668	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80 мест	


Риски: неосвоение средств субсидии на 2019 год

Пояснения: ведутся работы необходимые для заключения контракта.
Планируемый срок начала строительства - октябрь 2019 года.



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

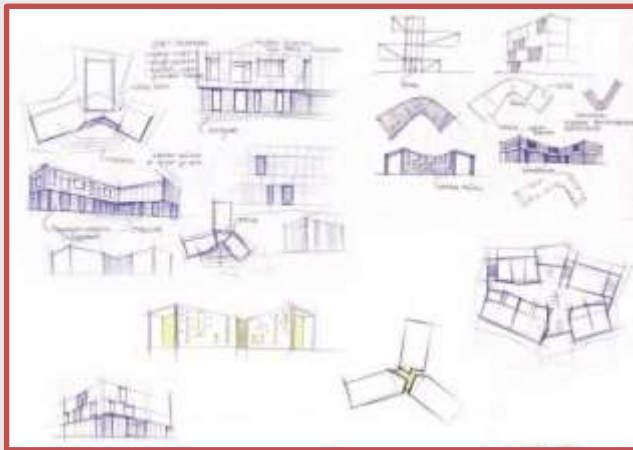

Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Усть-Абаканский район - Детский сад на 120 мест в с. Калинино	2019 год	48,085	47,604	0,481	0,000	0,000	0,000	0,00	0 мест	0%	
	2020 год	52,092	51,571	0,521	0,000	0,000	0,000	0,00	120 мест		
ИТОГО:		100,177	99,175	1,002	0,000	0,000	0,000	0,00	120 мест		

Риски: неосвоение средств субсидии на 2019 год

Пояснения: ведутся работы необходимые для заключения контракта.
Планируемый срок начала строительства - октябрь 2019 года.



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Ширинский район Детский сад на 260 мест в с. Шира, Иткульский район	2019 год	103,658	102,621	1,037	98,532	97,547	0,985	8,509	8,21	0 мест	2%
	2020 год	113,391	112,257	1,134	46,989	46,519	0,470	0,000	0,00	260 мест	
ИТОГО:		217,049	214,879	2,171	145,521	144,066	1,455	8,509	8,21	260 мест	


Риски: неосвоение средств субсидии на 2019 год

Пояснения: позднее начало проведения строительно-монтажных работ



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

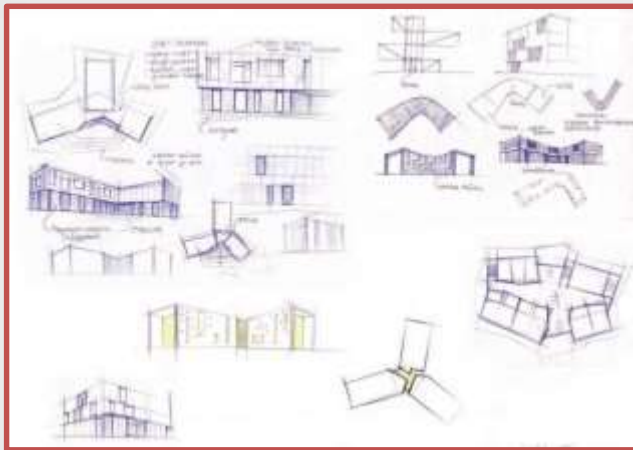

Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
г. Черногорск Детский сад (с бассейном) на 300 мест	2020 год	15,636	15,479	0,156	0,000	0,000	0,000	0,00	0 мест	0%	
	2021 год	234,806	232,458	2,348	0,000	0,000	0,000	0,00	300 мест		
ИТОГО:		250,441	247,937	2,505	0,000	0,000	0,000	0,00	300 мест		

Риски: X

Пояснения: реализация мероприятия с 2020 года



Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
г. Черногорск Детский сад на 120 мест	2020 год	15,636	15,479	0,156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0 мест	0%
	2021 год	84,541	83,696	0,845	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	120 мест	
ИТОГО:		100,177	99,175	1,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	120 мест	

Риски: X

Пояснения: реализация мероприятия с 2020 года



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

**Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом**



Информация по реализации регионального проекта

Объект	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели
	Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО			
Аскизский район Бирикчүльская СОШ	1,7305	1,5748	0,1557	2,1180	1,5748	0,5432	1,7305	100,00	1 объект
Бейский район Куйбышевская СШИ	2,4240	2,1840	0,2400	2,3790	2,1840	0,1950	2,4240	100,00	1 объект
Бейский район Сабинская ООШ	2,3230	2,0930	0,2300	2,3230	2,0930	0,2300	2,3230	100,00	1 объект
Бейский район Бейская СОШИ	0,5530	0,5460	0,0070	0,5530	0,5460	0,0070	0,5530	100,00	1 объект
Боградский район Боградская СОШ	2,4000	2,1840	0,2160	2,4000	2,1840	0,2160	2,4000	100,00	1 объект
Орджоникидзевский район Новомарьясовская СОШ-И	2,3000	2,0930	0,2070	2,4520	2,0930	0,3590	2,3000	100,00	1 объект
Таштыпский район Большесейская СОШ	2,3000	2,0930	0,2070	2,3000	2,0930	0,2070	2,3000	100,00	1 объект
Усть-Абаканский район Доможаковская СОШ им. Н.Г.Доможаков	2,4000	2,1840	0,2160	2,4240	2,1840	0,2400	2,4000	100,00	1 объект
Ширинский район Спиринская ОШ № 11	2,4000	2,1840	0,2160	2,4000	2,1840	0,2160	2,4000	100,00	1 объект
ИТОГО:	18,8835	17,1358	1,6947	19,4020	17,1358	2,2132	18,8835	100,00	9 объектов

Дополнительно Республике Хакасия на развитие школьного спорта в 2020-2022 годах выделена субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий на 23 объектах в объёме **45,523** млн. руб. :
в том числе в 2020 и 2021 годах – по 15,632 млн. руб., в 2022 году – 14,259 млн. руб.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

**Проект распределения субсидий Республике Хакасия
на 2020 - 2022 годы
в рамках реализации мероприятий национального
проекта «Образование»**



Информация по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование	Кол-во организация				Объем средств ФБ			
		Всего	в том числе по годам:			Всего	в том числе по годам:		
			2020	2021	2022		2020	2021	2022
1	Обновление материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам	4	1	2	1	30 003,20	7 736,90	14 458,10	7 808,20
2	Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (Точки роста)	37	37			40 917,80	40 917,80		
3	Создание детских технопарков «Кванториум»	1	1			72 622,30	72 622,30		
4	Создание мобильных детских технопарков «Кванториум»	4	1	3		66 090,0	16 764,60	49 325,4	
5	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	165	101	64		368 742,80	225 894,70	142 848,10	
6	Создание центров выявления и поддержки одаренных детей	1			1	350 981,3			350 981,3
7	Создание центров цифрового образования детей (IT-Куб)	1		1		12 256,40		12 256,40	
8	Формирование современных управленческих решений в системе дополнительного образования	1		1		15 452,8		15 452,8	
ИТОГО		214	141	71	2	957 066,6	363 936,30	234 340,8	358 789,5

Дополнительно Республике Хакасия на развитие школьного спорта в 2020-2022 годах выделена субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий на 23 объектах в объеме **45,523** млн. руб.:
в том числе в 2020 и 2021 годах – по 15,632 млн. руб., в 2022 году – 14,259 млн. руб.
