



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

**Объекты,  
ввод в эксплуатацию которых запланирован  
на 2019 год**



## Информация по реализации регионального проекта

**Мероприятия по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях**



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность	Оснащение оборудованием
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО					
<b>г. Абакан</b> Общеобразовательная школа на 1000 мест в 6 микрорайоне 1 жилого района	2018 год	525,884	478,554	47,330	449,539	409,080	40,459	449,536	85,48	0	98 %	86%
		в том числе неизрасходованные средства 2018 года, возвращенные в 2019 году:						Исполнение в 2019 году				
	76,347	69,476	6,871	76,347	69,476	6,871	34,531	45,22				
2019 год	215,570	196,169	19,401	212,937	193,773	19,164	189,553	87,93	1000 мест			
<b>ИТОГО:</b>		<b>741,454</b>	<b>674,723</b>	<b>66,731</b>	<b>662,476</b>	<b>602,853</b>	<b>59,623</b>	<b>673,620</b>	<b>90,85</b>	<b>1000 мест</b>		

**Риски:** отсутствуют

**Пояснения:** 14.10.2019 – открытие блока начальных классов. Завершение строительных работ второго блока – до 15.11.2019. Оснащение оборудованием, ввод всех новых мест – 01.12.2019.



## Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Детский сад на 300 мест с бассейном по адресу: г. Абакана, ул.Чехова, 151 в III жилом районе	2018 год	137,994	125,575	12,420	104,481	95,078	9,403	104,481	75,71	0 мест	96%
		в том числе неизрасходованные средства 2018 года, возвращенные в 2019 году:						Исполнение в 2019 году			
	33,513	30,497	3,016	33,513	30,497	3,016	1,198	3,57			
2019 год	56,308	51,241	5,067	56,308	51,241	5,067	42,454	75,400	300 мест		
<b>ИТОГО:</b>		<b>194,302</b>	<b>176,816</b>	<b>17,487</b>	<b>194,302</b>	<b>176,816</b>	<b>17,486</b>	<b>148,133</b>	<b>76,240</b>	<b>300 мест</b>	

Риски: отсутствуют

Пояснения: в настоящее время проводятся конкурсные процедуры на закупки оборудования  
Завершение строительных работ – до 01.11.2019. Ввод новых мест – 15.11.2019.



## Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Детский сад на 300 мест с бассейном по адресу: г. Абакана, ул.Арбан, во II жилом районе	2018 год	91,355	83,133	8,222	90,555	82,405	8,150	90,555	99,12	0 мест	90%
		в том числе неизрасходованные средства 2018 года, возвращенные в 2019 году:						Исполнение в 2019 году			
	0,800	0,728	0,072	0,800	0,728	0,072	0,800	100,00			
2019 год	101,878	92,709	9,169	101,878	92,709	9,169	59,026	57,940	300 мест		
<b>ИТОГО:</b>		<b>193,233</b>	<b>175,842</b>	<b>17,391</b>	<b>193,233</b>	<b>175,842</b>	<b>17,391</b>	<b>150,381</b>	<b>77,820</b>	<b>300 мест</b>	

Риски: отсутствуют

Пояснения: в настоящее время проводятся конкурсные процедуры на закупки оборудования  
Завершение строительных работ – до 01.11.2019. Ввод новых мест – 15.11.2019.



## Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Детский сад на 300 мест с бассейном по адресу: г. Абакана, ул. Литвинова	2018 год	65,948	60,013	5,935	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0 мест	65%
		в том числе неизрасходованные средства 2018 года, возвращенные в 2019 году:						Исполнение в 2019 году			
	65,948	60,013	5,935	65,948	60,013	5,935	20,124	30,51			
2019 год	136,772	124,463	12,309	136,772	124,463	12,309	89,699	65,580	300 мест		
<b>ИТОГО:</b>		<b>202,720</b>	<b>184,476</b>	<b>18,244</b>	<b>202,720</b>	<b>184,476</b>	<b>18,244</b>	<b>109,823</b>	<b>54,170</b>	<b>300 мест</b>	

**Риски:** ПРОИЗОШЛО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

**Пояснения:** Неосвоенные средства 2018 года возвращены по дополнительному соглашению в 2019 году. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на закупки оборудования. Завершение строительных работ – до 01.12.2019. Ввод новых мест – 20.12.2019.



## Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Алтайский район Детский сад на 60 мест в селе Белый Яр	2018 год	31,519	29,413	2,107	31,519	29,413	2,107	31,519	100,00	0 мест	99%
	2019 год	23,834	21,689	2,145	23,834	21,689	2,145	10,037	42,110	60 мест	
<b>ИТОГО:</b>		<b>55,353</b>	<b>51,102</b>	<b>4,252</b>	<b>55,353</b>	<b>51,102</b>	<b>4,252</b>	<b>41,556</b>	<b>75,070</b>	<b>60 мест</b>	

Риски: отсутствуют

Пояснения: Завершение строительных работ – до 01.10.2019. Ввод новых мест – 15.11.2019.



## Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Алтайский район Детский сад на 60 мест в селе Подсинее	2018 год	15,242	13,140	2,102	7,616	6,930	0,686	7,616	49,97	0 мест	66%
		в том числе неизрасходованные средства 2018 года, возвращенные в 2019 году:						Исполнение в 2019 году			
	6,824	6,210	0,614	6,824	6,210	0,614	5,594	81,97			
	2019 год	39,516	35,960	3,556	39,516	35,960	3,556	13,673	34,600	60 мест	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>54,758</b>	<b>49,830</b>	<b>4,928</b>	<b>53,956</b>	<b>49,100</b>	<b>4,856</b>	<b>26,883</b>	<b>49,090</b>	<b>60 мест</b>	

Риски: ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ

Пояснения: Завершение строительных работ – до 01.12.2019. Ввод новых мест – 20.12.2019.



## Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Аскизский район Детский сад на 120 мест в селе Аскиз	2018 год	46,052	41,907	4,145	46,053	41,908	4,145	46,053	100,00	0 мест	97%
	2019 год	50,894	46,314	4,580	50,894	46,314	4,580	35,894	70,530	120 мест	
<b>ИТОГО:</b>		<b>96,946</b>	<b>88,221</b>	<b>8,725</b>	<b>96,947</b>	<b>88,222</b>	<b>8,725</b>	<b>81,947</b>	<b>84,530</b>	<b>120 мест</b>	

**Риски:** отсутствуют

**Пояснения:** Муниципальному образованию из республиканского бюджета выделены дополнительные средства в объеме 12,4 млн. руб.

Завершение строительных работ – до 01.10.2019. Ввод новых мест – 15.11.2019.





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

**Объекты,  
ввод в эксплуатацию которых запланирован  
на 2020 год**



## Информация по реализации регионального проекта

**Мероприятия по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях**



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Усть-Абаканский район Общеобразовательная школа на 250 мест в д. Чапаево	2019 год	107,604	97,920	9,684	106,425	96,847	9,578	20,531	19,08	0 мест	9%
	2020 год	179,856	163,669	16,187	79,950	72,755	7,195	0,0	0,0	250 мест	
<b>ИТОГО:</b>		<b>287,460</b>	<b>261,589</b>	<b>25,872</b>	<b>186,375</b>	<b>169,602</b>	<b>16,773</b>	<b>20,531</b>	<b>7,14</b>	<b>250 мест</b>	

**Риски:** неосвоение средств субсидии на 2019 год

**Пояснения:** Планируется освоить 60 млн, приобретением оборудования – 27,073 млн. руб.



## Информация по реализации регионального проекта

### Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
г. Абакан Общеобразовательная школа на 1000 мест в 8 микрорайоне	2019 год	259,621	257,025	2,596	259,621	257,025	2,596	117,735	45,35	0 мест	13%
	2020 год	629,921	623,622	6,299	629,921	623,622	6,299	0,000	0,00	1000 мест	
<b>ИТОГО:</b>		<b>889,542</b>	<b>880,647</b>	<b>8,895</b>	<b>767,629</b>	<b>759,953</b>	<b>7,676</b>	<b>117,735</b>	<b>13,23</b>	<b>1000 мест</b>	

Риски: отсутствуют

Пояснения: Согласовано перераспределение средств субсидии с 2019 на 2020 год в размере 370,3 млн. руб.



## Информация по реализации регионального проекта

### Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Ширинский район Учительский дом на 20 мест в аал Трошкино	2019 год	27,723	27,000	0,7230	—	—	—	—	—	20 мест	100%
<b>ИТОГО:</b>		<b>27,723</b>	<b>27</b>	<b>0,723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 мест</b>	

**Риски:** отсутствуют

**Пояснения:** В 2018 году введено 20 мест путём строительства школа – учительского дома в аале Трошкино построена и начала работу 01.09.2018.

Финансирование строительства объекта в размере 29,847 млн. рублей в полном объёме произведено из средств регионального бюджета (использование механизма возмещения затрат регионального бюджета).

## Информация по реализации регионального проекта

**Мероприятия по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа**



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Ширинский район Общеобразовательная школа на 250 мест в с. Целинное	2019 год	149,449	147,955	1,495	147,919	146,440	1,479	46,784	31,30	0 мест	12%
	2020 год	149,703	148,206	1,497	70,334	69,631	0,703	0,000	0,00	250 мест	
<b>ИТОГО:</b>		<b>299,153</b>	<b>296,161</b>	<b>2,992</b>	<b>218,253</b>	<b>216,071</b>	<b>2,182</b>	<b>46,784</b>	<b>15,64</b>	<b>250 мест</b>	

Риски: отсутствуют

Пояснения: Планируется освоить 90 млн, приобретением оборудования – 24,577 млн. руб.



**Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования**



## Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Аскизский район Детский сад на 60 мест в п. Аскиз	2019 год	24,041	23,800	0,240	24,041	23,801	0,240	0,000	0,00	0 мест	1,4%
	2020 год	26,046	25,785	0,261	34,286	25,785	8,501	0,000	0,00	60 мест	
<b>ИТОГО:</b>		<b>50,087</b>	<b>49,586</b>	<b>0,501</b>	<b>58,327</b>	<b>49,586</b>	<b>8,741</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>60 мест</b>	

Риски: неосвоение средств субсидии на 2019 год

Пояснения: позднее начало проведения строительно-монтажных работ



## Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Аскизский район Детский сад на 120 мест в с. Бельтирское	2019 год	50,088	49,587	0,501	50,594	49,587	1,007	20,582	41,09	0 мест	29,6%
	2020 год	50,088	49,587	0,501	50,594	49,587	1,007	0,000	0,00	120 мест	
<b>ИТОГО:</b>		<b>100,177</b>	<b>99,175</b>	<b>1,002</b>	<b>101,188</b>	<b>99,175</b>	<b>2,013</b>	<b>20,582</b>	<b>20,55</b>	<b>120 мест</b>	

Риски: X


Пояснения: X





## Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

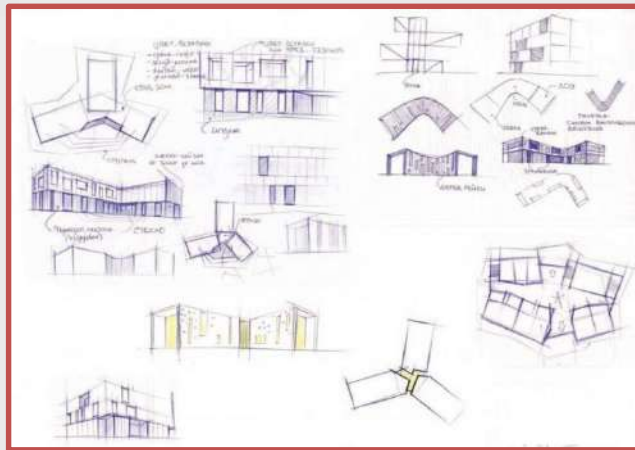

Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Бейский район Детский сад на 80 мест в с. Новокурск	2019 год	32,057	31,736	0,321	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0 мест	0%
	2020 год	34,728	34,381	0,347	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80 мест	
<b>ИТОГО:</b>		<b>66,784</b>	<b>66,117</b>	<b>0,668</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>80 мест</b>	

**Риски:** неосвоение средств субсидии на 2019 год

**Пояснения:** ведутся работы необходимые для заключения контракта.  
Планируемый срок начала строительства - октябрь 2019 года.



## Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Усть-Абаканский район - Детский сад на 120 мест в с. Калинино	2019 год	48,085	47,604	0,481	0,000	0,000	0,000	0,00	0 мест	1%	
	2020 год	52,092	51,571	0,521	0,000	0,000	0,000	0,00	120 мест		
<b>ИТОГО:</b>		<b>100,177</b>	<b>99,175</b>	<b>1,002</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>120 мест</b>		

**Риски:** неосвоение средств субсидии на 2019 год

**Пояснения:** ведутся работы необходимые для заключения контракта.  
Планируемый срок начала строительства - октябрь 2019 года.



## Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
Ширинский район Детский сад на 260 мест в с. Шира, Иткульский район	2019 год	103,658	102,621	1,037	98,532	97,547	0,985	8,509	8,21	0 мест	8,21%
	2020 год	113,391	112,257	1,134	46,989	46,519	0,470	0,000	0,00	260 мест	
<b>ИТОГО:</b>		<b>217,049</b>	<b>214,879</b>	<b>2,171</b>	<b>145,521</b>	<b>144,066</b>	<b>1,455</b>	<b>8,509</b>	<b>3,92</b>	<b>260 мест</b>	


Риски: неосвоение средств субсидии на 2019 год

Пояснения: позднее начало проведения строительно-монтажных работ



## Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

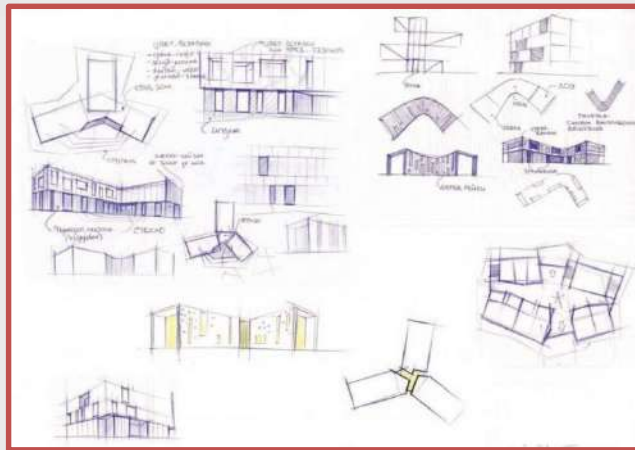

Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
г. Черногорск Детский сад (с бассейном) на 300 мест	2020 год	15,636	15,479	0,156	0,000	0,000	0,000	0,00	0 мест	0%	
	2021 год	234,806	232,458	2,348	0,000	0,000	0,000	0,00	300 мест		
<b>ИТОГО:</b>		<b>250,441</b>	<b>247,937</b>	<b>2,505</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>300 мест</b>		


Риски: X

Пояснения: реализация мероприятия с 2020 года



## Информация по реализации регионального проекта

Мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

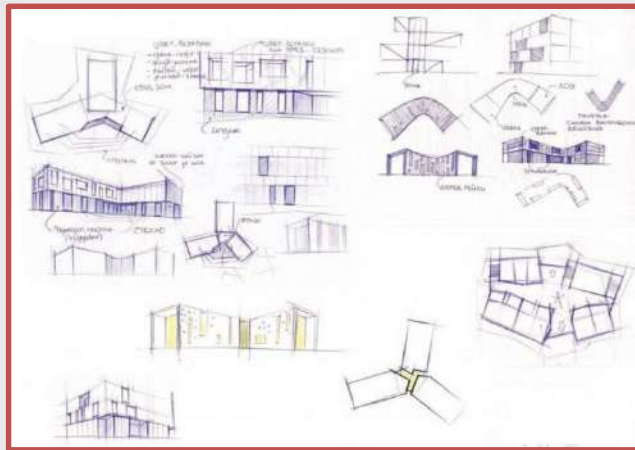

Объект строительства	Год	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели	Строительная готовность
		Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО				
г. Черногорск Детский сад на 120 мест	2020 год	15,636	15,479	0,156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0 мест	0%
	2021 год	84,541	83,696	0,845	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	120 мест	
<b>ИТОГО:</b>		<b>100,177</b>	<b>99,175</b>	<b>1,002</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>120 мест</b>	

Риски: X

Пояснения: реализация мероприятия с 2020 года



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

**Создание в общеобразовательных организациях,  
расположенных в сельской местности, условий для  
занятия физической культурой и спортом**



## Информация по реализации регионального проекта

Объект	Объем средств на реализацию			Сумма средств по принятым обязательствам (по заключенному контракту/соглашению)			Объем финансирования	Процент финансирования (%)	Показатели
	Всего:	ФБ	РБ+МО	Всего:	ФБ	РБ+МО			
<b>Аскизский район</b> Бирикчүльская СОШ	1,7305	1,5748	0,1557	2,1180	1,5748	0,5432	1,7305	100,00	1 объект
<b>Бейский район</b> Куйбышевская СШИ	2,4240	2,1840	0,2400	2,3790	2,1840	0,1950	2,4240	100,00	1 объект
<b>Бейский район</b> Сабинская ООШ	2,3230	2,0930	0,2300	2,3230	2,0930	0,2300	0,0000	0,00	1 объект
<b>Бейский район</b> Бейская СОШИ	0,5530	0,5460	0,0070	0,5530	0,5460	0,0070	0,0000	0,00	1 объект
<b>Боградский район</b> Боградская СОШ	2,4000	2,1840	0,2160	2,4000	2,1840	0,2160	2,4000	100,00	1 объект
<b>Орджоникидзевский район</b> Новомарьясовская СОШ-И	2,3000	2,0930	0,2070	2,4520	2,0930	0,3590	2,3000	100,00	1 объект
<b>Таштыпский район</b> Большесейская СОШ	2,3000	2,0930	0,2070	2,3000	2,0930	0,2070	2,3000	100,00	1 объект
<b>Усть-Абаканский район</b> Доможаковская СОШ им. Н.Г.Доможаков	2,4000	2,1840	0,2160	2,4240	2,1840	0,2400	0,4374	18,23	1 объект
<b>Ширинский район</b> Спиринская ОШ № 11	2,4000	2,1840	0,2160	2,4000	2,1840	0,2160	2,4000	100,00	1 объект
<b>ИТОГО:</b>	<b>18,8835</b>	<b>17,1358</b>	<b>1,6947</b>	<b>19,4020</b>	<b>17,1358</b>	<b>2,2132</b>	<b>13,9919</b>	<b>68,69</b>	<b>9 объектов</b>

Дополнительно Республике Хакасия на развитие школьного спорта в 2020-2022 годах выделена субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий на 23 объектах в объёме **45,523** млн. руб. :  
в том числе в 2020 и 2021 годах – по 15,632 млн. руб., в 2022 году – 14,259 млн. руб.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

**Проект распределения субсидий Республике Хакасия  
на 2020 - 2022 годы  
в рамках реализации мероприятий национального  
проекта «Образование»**





## Информация по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование	Кол-во организация				Объем средств ФБ			
		Всего	в том числе по годам:			Всего	в том числе по годам:		
			2020	2021	2022		2020	2021	2022
1	Обновление материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам	4	1	2	1	30 003,20	7 736,90	14 458,10	7 808,20
2	Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (Точки роста)	37	37			40 917,80	40 917,80		
3	Создание детских технопарков «Кванториум»	1	1			72 622,30	72 622,30		
4	Создание мобильных детских технопарков «Кванториум»	4	1	3		66 090,0	16 764,60	49 325,4	
5	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	165	101	64		368 742,80	225 894,70	142 848,10	
6	Создание центров выявления и поддержки одаренных детей	1			1	350 981,3			350 981,3
7	Создание центров цифрового образования детей (IT-Куб)	1		1		12 256,40		12 256,40	
8	Формирование современных управленческих решений в системе дополнительного образования	1		1		15 452,8		15 452,8	
<b>ИТОГО</b>		<b>214</b>	<b>141</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>957 066,6</b>	<b>363 936,30</b>	<b>234 340,8</b>	<b>358 789,5</b>

Дополнительно Республике Хакасия на развитие школьного спорта в 2020-2022 годах выделена субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий на 23 объектах в объеме **45,523** млн. руб.:  
в том числе в 2020 и 2021 годах – по 15,632 млн. руб., в 2022 году – 14,259 млн. руб.
